



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 43

MES: MARZO 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)



DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$20,546,853.71	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$42,945,218.55	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 11)	22 de mayo de 2022
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato)	\$529,085,459.32	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)


Monto del Contrato US\$465,593,387,06

■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

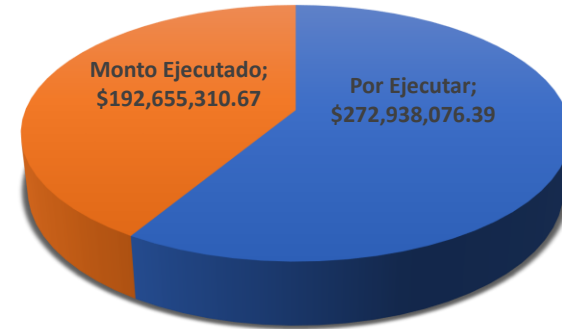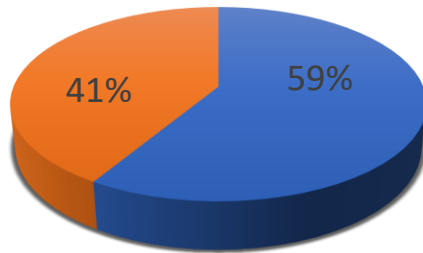


AVANCE FÍSICO

Avance de Diseño

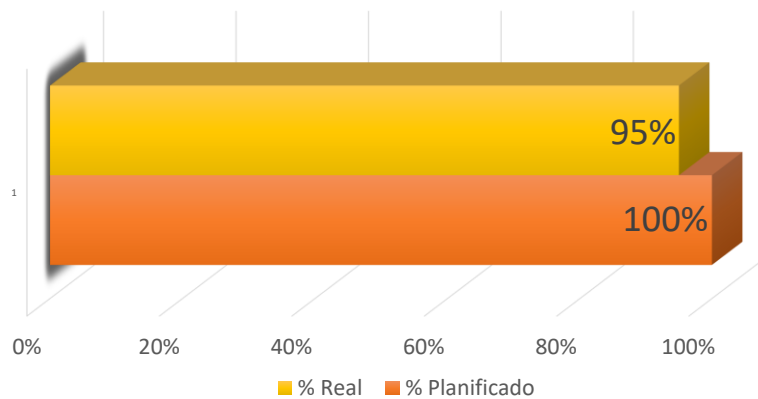

Avance Físico de Construcción

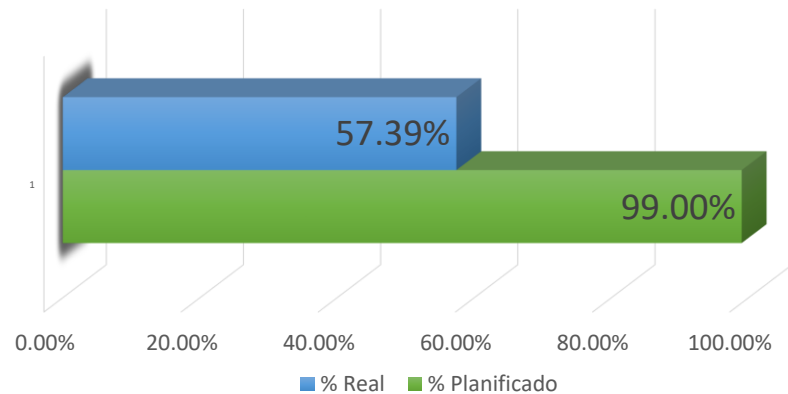



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 43

MES: MARZO 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	33	96.55%
Terminados	16	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	27	29.35%
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	
En Ejecución	10	8.64%
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	
En Ejecución	2	7.67%
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	
En Ejecución	13	41.67%
Terminados	0	

DRENAJES

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	
Alc faltante x Ejecutar LI	37	
Alc faltante x Ejecutar LD	48	Avance LD: 87,99%
Alc Terminadas LD	271	Avance LI: 84,42%
Alc Terminadas LI	260	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	51.40	
Km en Ejecución	48.00	44.68%
Km Terminados	48.00	

SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial	Cantidad	Avance
Km Totales	107.50	
Km en Ejecución	45.80	42.62%
Km Terminados	45.80	

CONSTRUCCION DE LA VIA

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	89.10	Avance LD: 82,93%
Km en ejecución LI	65.40	Avance LI: 54,60,88%
Km terminados LD	89.20	
Km terminados LI	65.50	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	86.10	Avance LD: 80,08%
Km en ejecución LI	35.20	Avance LI: 32,74%
Km terminados LD	86.10	
Km terminados LI	35.20	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en primera capa LD	77.90	Avance LD: 55,40%
Km terminados LD	59.60	Avance LI: 13,28%
Km en primera capa LI	16.90	
Km terminados LI	14.30	

REHABILITACIÓN DE LA VIA

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	37.02	38.71%
Km Terminados	0.00	



OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	
En Ejecución	0.00	0.00%
Terminados	0	

Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	
Km en Ejecución	9.02	22.74%
Km Terminados	0	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	
Km en Ejecución	18.84	39.82%
Km Terminados	0	

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

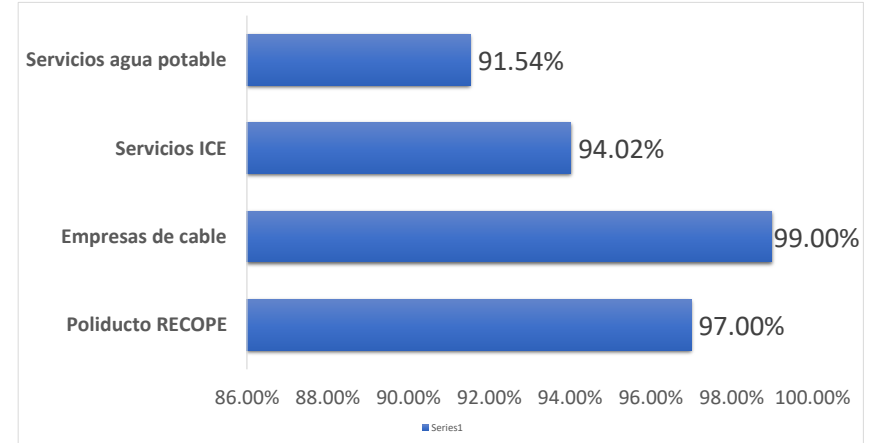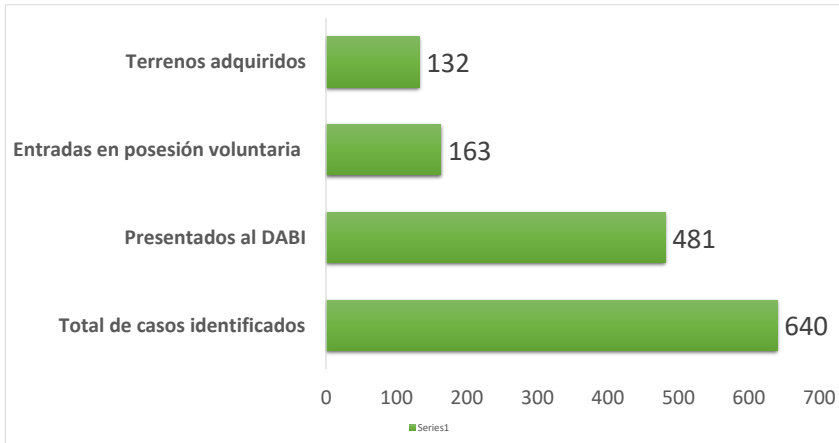EXPROPIACIONES
REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

Resumen estado atención ciudadana (oficinas COAPRO)					
Cantón.	Total de casos atendidos.	Casos en etapa de seguimiento.	Casos en proceso de resolución.	Casos finalizados.	Control total de caso.
Marzo 2022					
Pococí	21	0	13	8	59
Guácimo	56	0	34	22	136
Siquirres	62	0	37	25	134
Matina	72	0	28	44	166
Limón	7	0	1	6	12
Total	218	0	113	105	507
A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos.					
Total casos atendidos: como su palabra lo indica es el total de casos atendidos en el mes.					
Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).					
Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solución por parte de CHEC, por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y alguna institución.					
Casos finalizados: como su palabra lo dice los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.					
Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.					
