



# INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 44

MES: ABRIL 2022



Consejo Nacional de Vialidad CONAVI

OBRA: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo  
 SECCION: Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

CONTRATISTA: China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A  
 GESTOR DEL PROYECTO: Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)


## DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$20,546,853.71	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$42,945,218.55	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13)	<b>08 de febrero de 2023</b>
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato)	\$529,085,459.32	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días

## AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)


### Monto del Contrato US\$465,593,387,06

■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

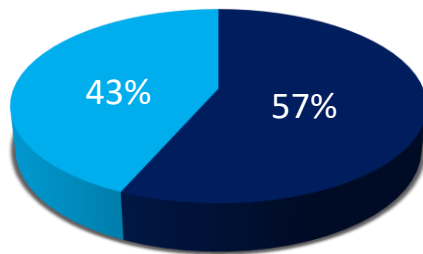


## AVANCE FÍSICO


### Avance Diseño

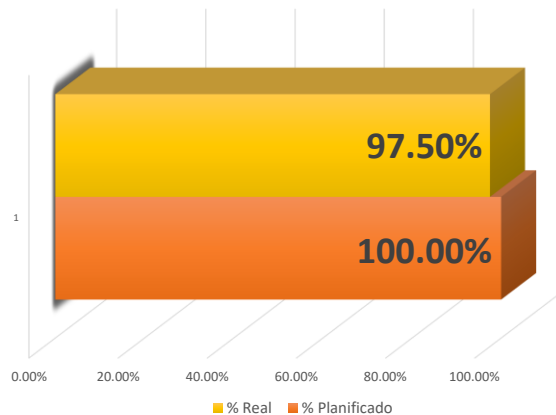

### Avance Físico Construcción

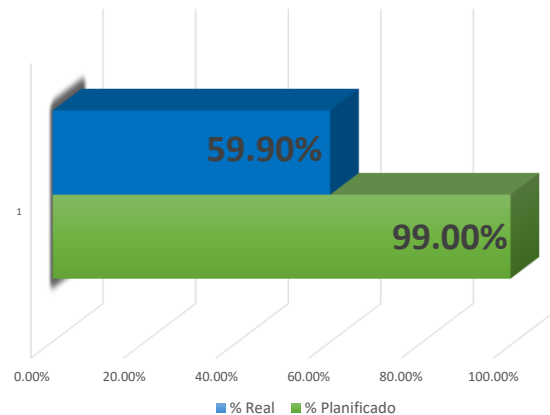

### Avance Físico Diseño + Construcción

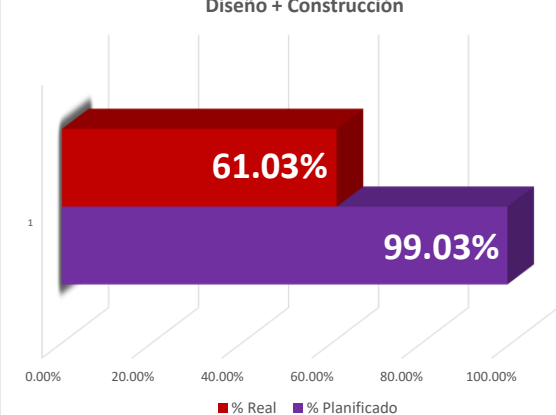



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 44

MES: ABRIL 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

**DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA**

**ESTRUCTURAS MAYORES**

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	33	96.74%
Terminados	18	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	28	32.73%
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	
En Ejecución	10	10.43%
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	
En Ejecución	2	7.67%
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	
En Ejecución	13	54.17%
Terminados	0	

**DRENAJES**

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	
Alc faltante x Ejecutar LI	35	
Alc faltante x Ejecutar LD	41	Avance LD: 88,64%
Alc Terminadas LD	273	Avance LI: 86,69%
Alc Terminadas LI	267	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	51.40	
Km en Ejecución	50.80	47.34%
Km Terminados	50.80	

**SEGURIDAD VIAL**

Seguridad Vial	Cantidad	Avance
Km Totales	107.50	
Km en Ejecución	54.16	50.43%
Km Terminados	54.16	

**CONSTRUCCION DE LA VIA**

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	89.90	Avance LD: 83,67%
Km en ejecución LI	81.00	Avance LI: 75,35%
Km terminados LD	90.00	
Km terminados LI	81.00	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	86.90	Avance LD: 80,81%
Km en ejecución LI	41.90	Avance LI: 38,97%
Km terminados LD	86.90	
Km terminados LI	41.90	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en primera capa LD	80.00	Avance LD: 53,63%
Km terminados LD	59.60	Avance LI: 18,98%
Km en primera capa LI	26.40	
Km terminados LI	20.40	

**REHABILITACIÓN DE LA VIA**

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	50.21	46.71%
Km Terminados	0.00	

**OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES**

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	
En Ejecución	0.00	0.00%
Terminados	0	

Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	
Km en Ejecución	10.10	40.42%
Km Terminados	0	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	
Km en Ejecución	18.84	41.94%
Km Terminados	0	



# INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 44



MES: ABRIL 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

## EXPROPIACIONES

## REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

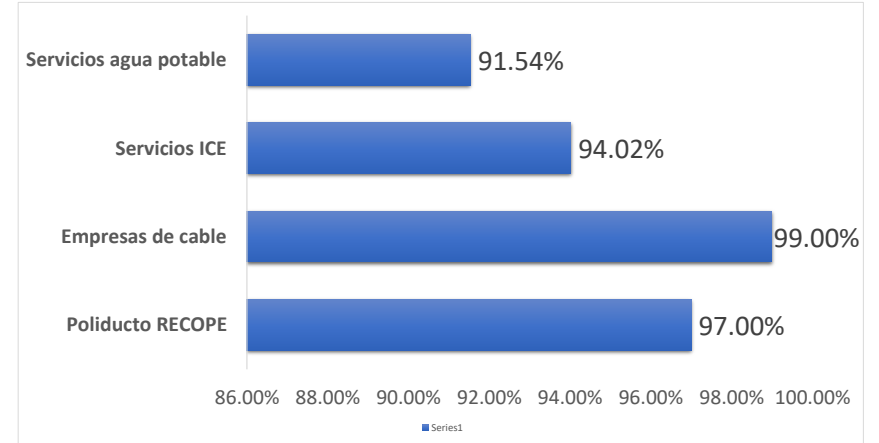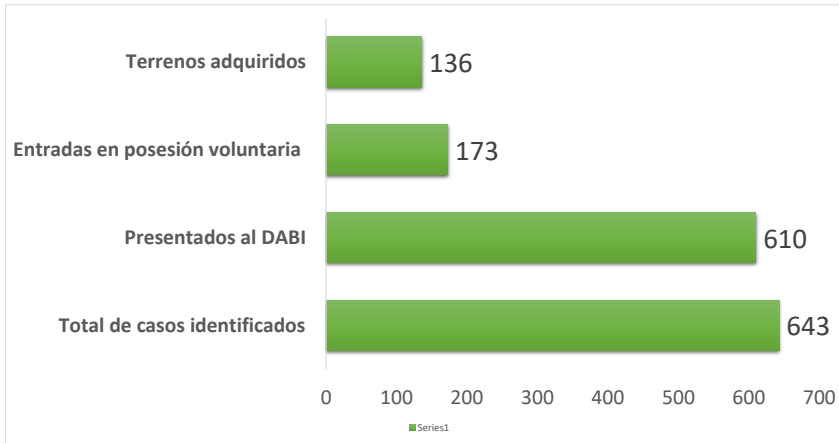

## ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

### Resumen estado atención ciudadana (oficinas COAPRO)

Cantón.	Total de casos atendidos.	Casos en etapa de seguimiento.	Casos en proceso de resolución.	Casos finalizados.	Control total de caso.
<b>Abril 2022</b>					
Pococí	36	0	18	18	66
Guácimo	49	0	32	17	94
Siquirres	60	0	25	35	103
Matina	33	1	23	9	61
Limón	7	0	4	3	10
<b>Total</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>102</b>	<b>82</b>	<b>334</b>

A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos.

**Total casos atendidos:** como su palabra lo indica es el total de casos atendidos en el mes.

**Casos en seguimiento:** son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamento de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

**Casos en proceso:** son aquellos casos en espera de respuesta o solución por parte de CHEC, por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y alguna institución.

**Casos finalizados:** como su palabra lo dice los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

**Control de casos:** corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.
