



# INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 45

MES: MAYO 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)


## DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$20,546,853.71	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$42,945,218.55	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13)	<b>08 de febrero de 2023</b>
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato)	\$529,085,459.32	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días

## AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)


### Monto del Contrato US\$465,593,387,06

■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

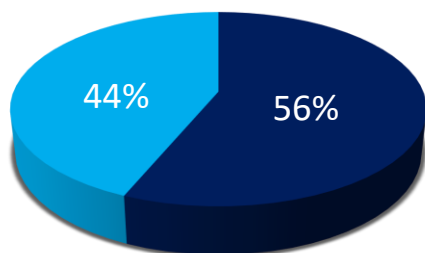


## AVANCE FÍSICO


### Avance Diseño

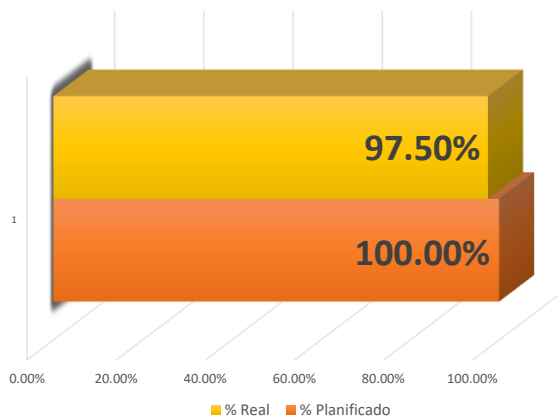

### Avance Físico Construcción

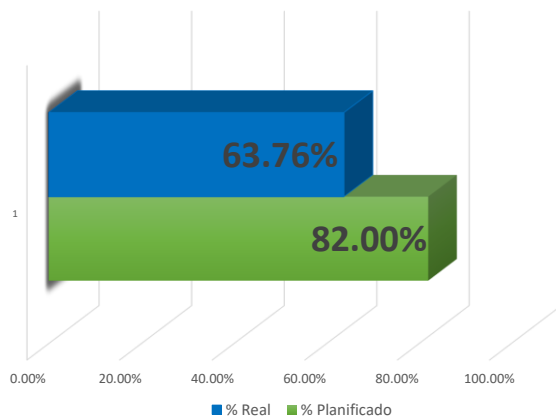

### Avance Físico Diseño + Construcción

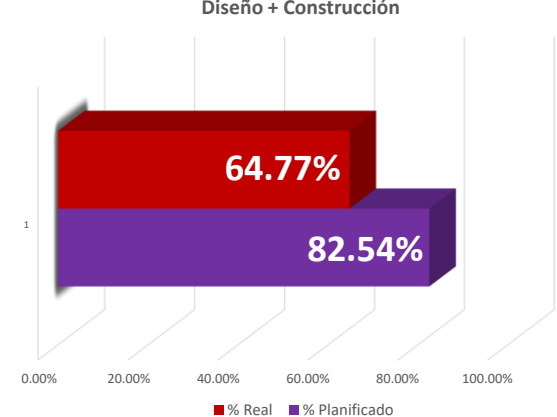



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 45

MES: MAYO 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

**DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA**

**ESTRUCTURAS MAYORES**

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	33	96.95%
Terminados	18	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	28	33.23%
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	
En Ejecución	10	11.45%
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	
En Ejecución	2	7.67%
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	
En Ejecución	13	54.17%
Terminados	0	

**DRENAJES**

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	
Alc faltante x Ejecutar LI	30	
Alc faltante x Ejecutar LD	36	Avance LD: 90,26%
Alc Terminadas LD	278	Avance LI: 88,31%
Alc Terminadas LI	272	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	51.40	
Km en Ejecución	51.20	47.67%
Km Terminados	51.20	

**SEGURIDAD VIAL**

Seguridad Vial	Cantidad	Avance
Km Totales	107.50	
Km en Ejecución	55.39	51.57%
Km Terminados	55.39	

**CONSTRUCCION DE LA VIA**

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	90.30	Avance LD: 84,01%
Km en ejecución LI	81.40	Avance LI: 75,77%
Km terminados LD	90.30	
Km terminados LI	81.50	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	87.40	Avance LD: 81,27%
Km en ejecución LI	50.80	Avance LI: 47,26%
Km terminados LD	87.40	
Km terminados LI	50.80	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en primera capa LD	81.50	Avance LD: 63,53%
Km terminados LD	68.30	Avance LI: 26,66%
Km en primera capa LI	38.40	
Km terminados LI	28.70	

**REHABILITACIÓN DE LA VIA**

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	50.21	46.71%
Km Terminados	0.00	




**OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES**

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	
En Ejecución	11.00	25.72%
Terminados	0	

Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	
Km en Ejecución	14.69	50.25%
Km Terminados	0	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	
Km en Ejecución	19.15	47.54%
Km Terminados	0	

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

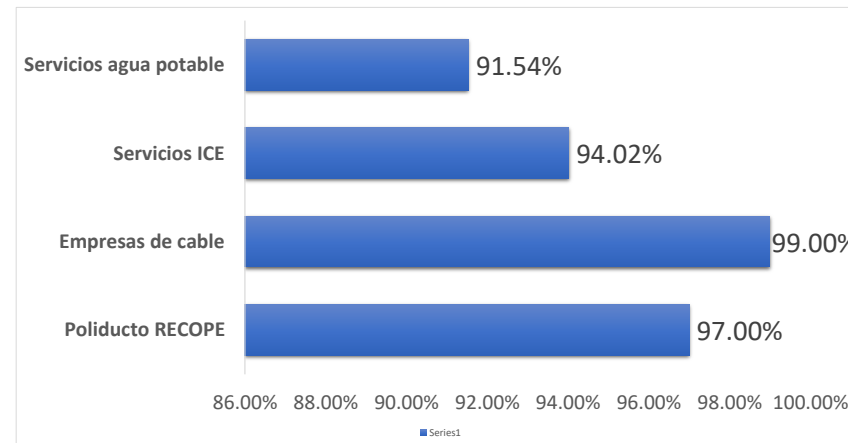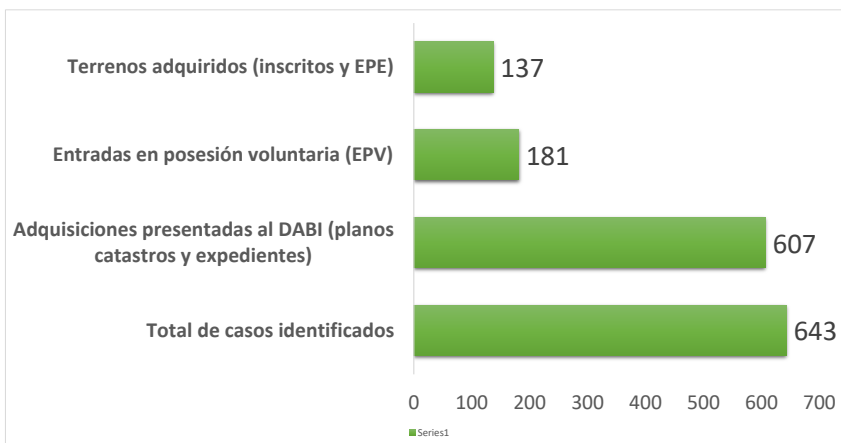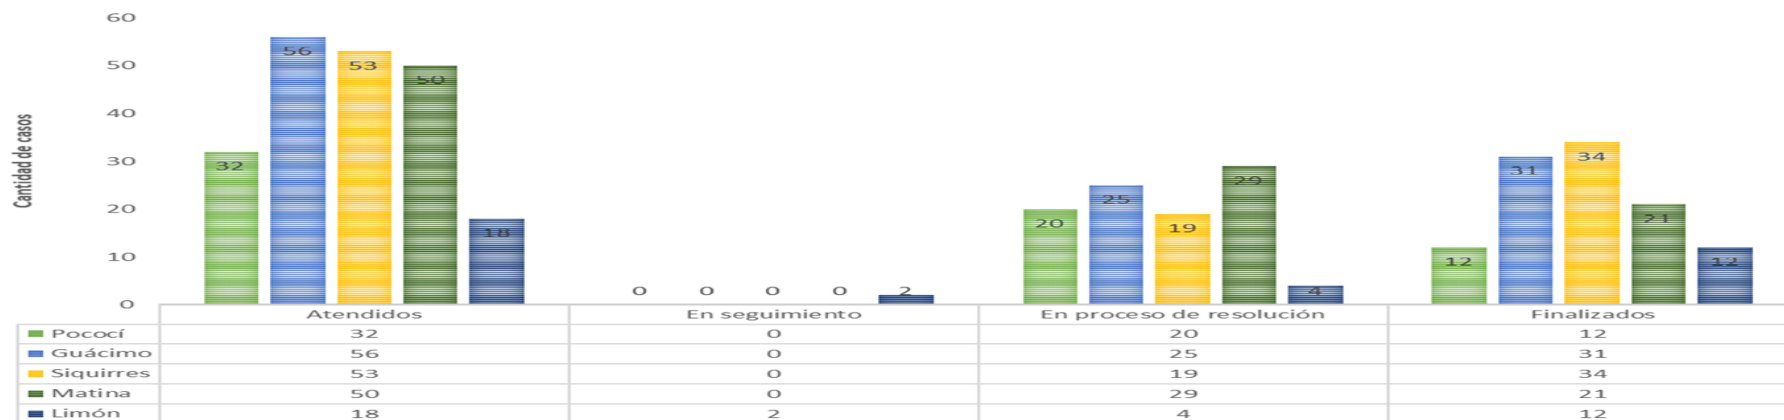**EXPROPIACIONES**
**REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)**
**RESUMEN ESTADO ATENCIÓN CIUDADANA (COAPRO) MAYO 2022**


A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

**Total casos atendidos:** es el total de casos atendidos en el mes.

**Casos en seguimiento:** son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamento de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

**Casos en proceso:** son aquellos casos en espera de respuesta o solución por parte de CHEC, por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

**Casos finalizados:** son los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

**Control de casos:** corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.
