



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 46

MES: JUNIO 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)



DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$20,546,853.71	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$42,945,218.55	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13)	08 de febrero de 2023
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato)	\$529,085,459.32	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)


Monto del Contrato US\$465,593,387,06

■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

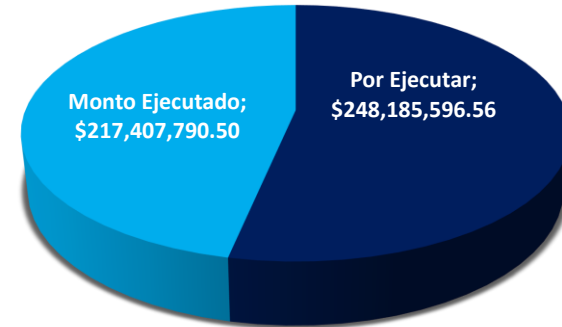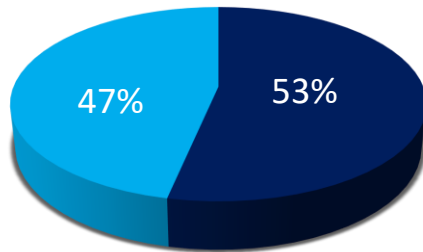


AVANCE FÍSICO


Avance Diseño

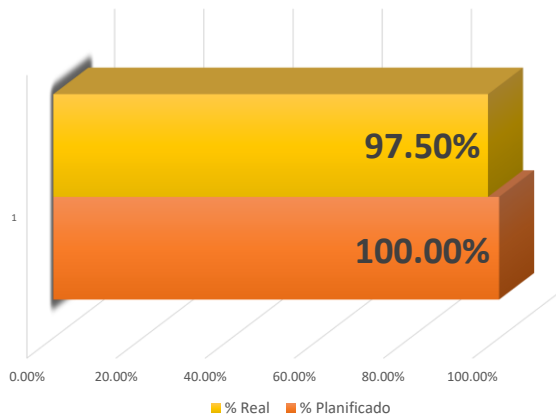

Avance Físico Construcción

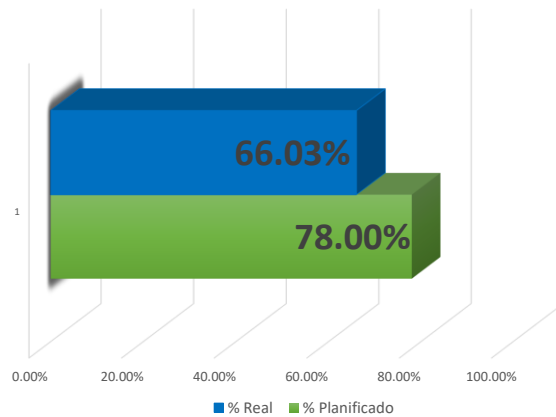

Avance Físico Diseño + Construcción

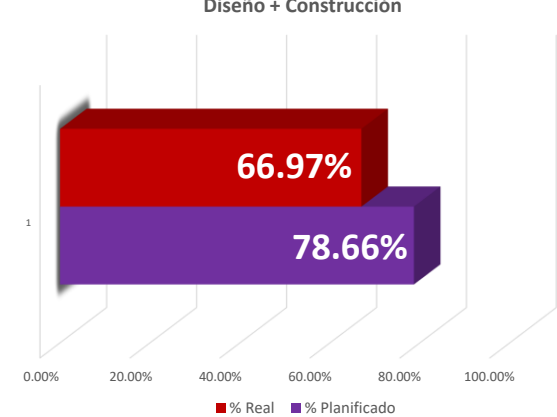



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 46

MES: JUNIO 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	33	97.21%
Terminados	20	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	28	38.23%
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	
En Ejecución	10	13.22%
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	
En Ejecución	2	12.96%
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	
En Ejecución	13	54.17%
Terminados	0	

DRENAJES

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	
Alc faltante x Ejecutar LI	26	Avance LD: 91,56% Avance LI: 89,61%
Alc faltante x Ejecutar LD	32	
Alc Terminadas LD	282	
Alc Terminadas LI	276	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	107.40	
Km en Ejecución	53.10	49.45%
Km Terminados	53.10	

SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial	Cantidad	Avance
Km Totales	107.50	
Km en Ejecución	58.90	54.84%
Km Terminados	58.90	

CONSTRUCCION DE LA VIA

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	90.80	Avance LD: 84,42%
Km en ejecución LI	84.40	
Km terminados LD	90.80	Avance LI: 78,55%
Km terminados LI	84.50	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	87.80	Avance LD: 81,68%
Km en ejecución LI	55.60	
Km terminados LD	87.80	Avance LI: 51,73%
Km terminados LI	55.60	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en primera capa LD	82.10	Avance LD: 66,09%
Km terminados LD	71.10	
Km en primera capa LI	39.70	Avance LI: 34,66%
Km terminados LI	37.30	

REHABILITACIÓN DE LA VIA

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	50.21	54.37%
Km Terminados	0.00	

OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	
En Ejecución	12.00	29.33%
Terminados	0	



Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	
Km en Ejecución	15.79	53.75%
Km Terminados	13.75	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	
Km en Ejecución	19.15	53.06%
Km Terminados	2,169,20	

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)


EXPROPIACIONES

REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

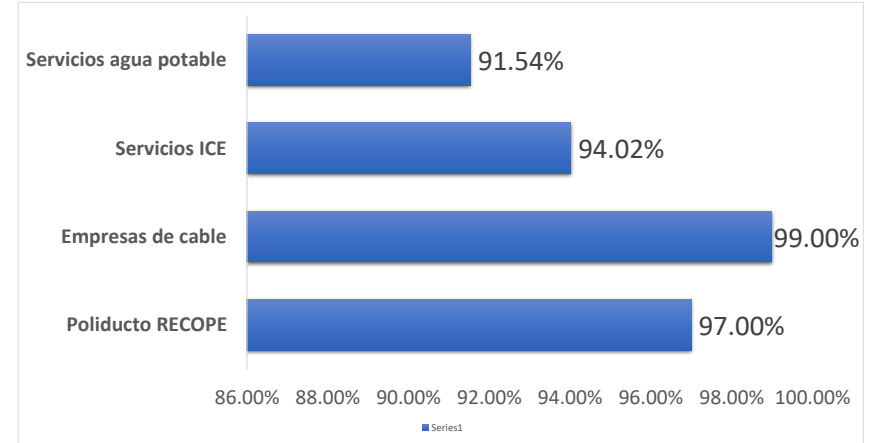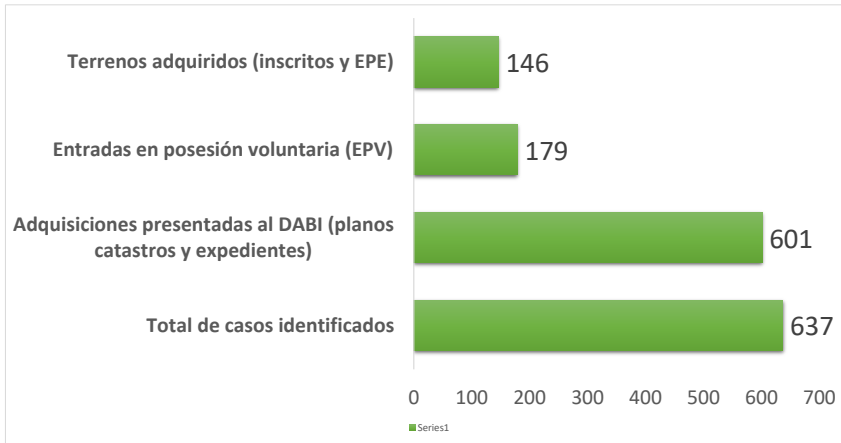

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

RESUMEN ESTADO ATENCIÓN CIUDADANA (COAPRO) JUNIO 2022

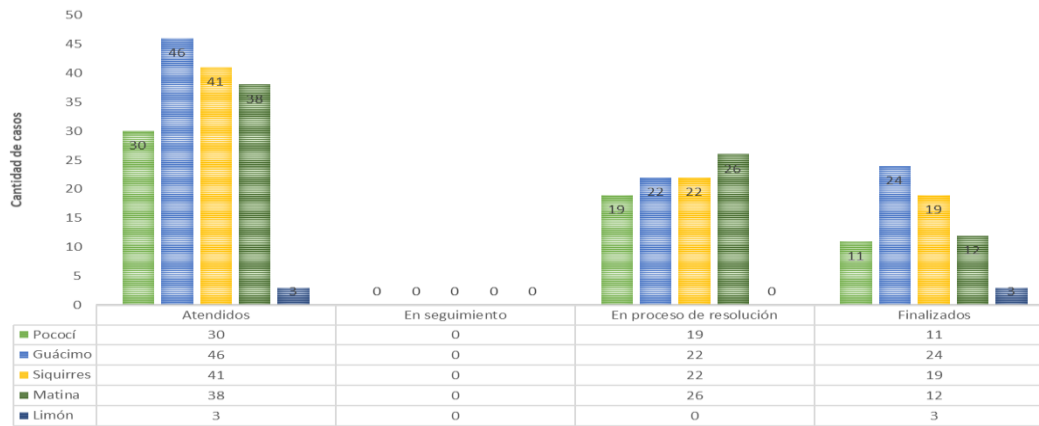

A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes.

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamento de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solución por parte de CHEC, por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.
