



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 48

MES: AGOSTO 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)


DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$20,832,725.02	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$42,945,218.45	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13)	08 de febrero de 2023
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato)	\$529,371,330.53	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)


Monto del Contrato US\$465,593,387,06

■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

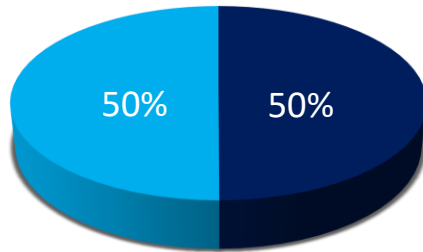


AVANCE FÍSICO


Avance Diseño

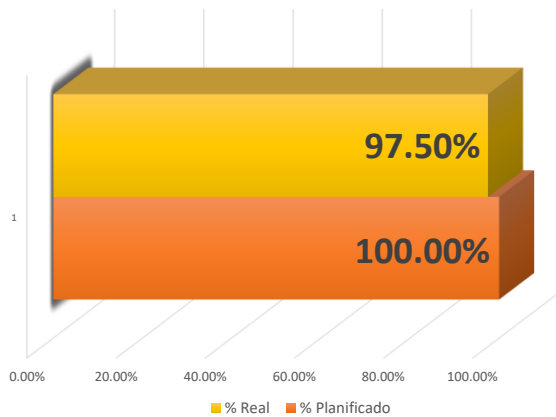

Avance Físico Construcción

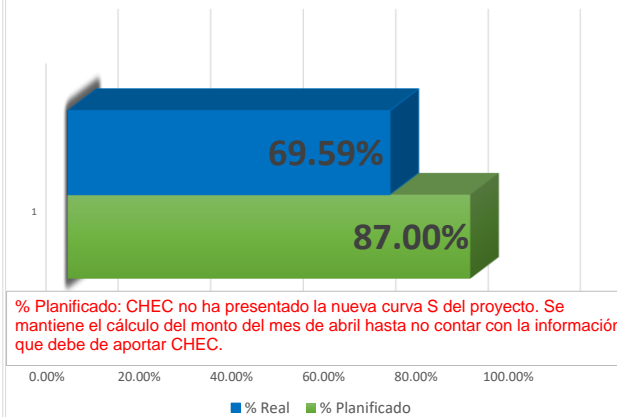

Avance Físico Diseño + Construcción

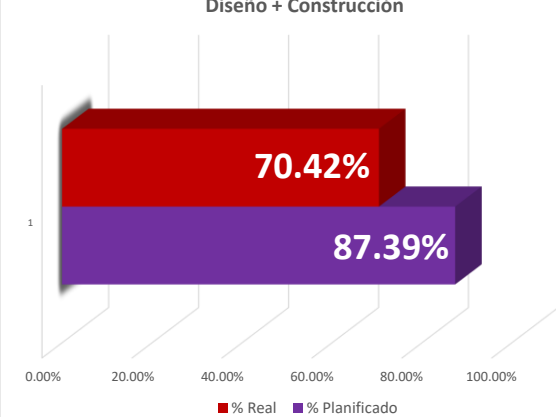



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 48

MES: AGOSTO 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	33	97.80%
Terminados	20	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	29	87.88%
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	
En Ejecución	11	16.99%
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	
En Ejecución	2	16.55%
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	
En Ejecución	18	75.00%
Terminados	0	

DRENAJES

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	
Alc faltante x Ejecutar LI	24	
Alc faltante x Ejecutar LD	31	Avance LD: 92,21%
Alc Terminadas LD	284	Avance LI: 89,94%
Alc Terminadas LI	277	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	107.40	
Km en Ejecución	60.10	55.98%
Km Terminados	60.10	

SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial	Cantidad	Avance
Km Totales	107.50	
Km en Ejecución	67.93	63.25%
Km Terminados	67.93	

CONSTRUCCION DE LA VIA

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	93.70	Avance LD: 87,19%
Km en ejecución LI	87.00	Avance LI: 80,97%
Km terminados LD	93.70	
Km terminados LI	87.10	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	91.60	Avance LD: 85,26%
Km en ejecución LI	61.80	Avance LI: 57,50%
Km terminados LD	91.70	
Km terminados LI	61.80	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en primera capa LD	83.80	Avance LD: 72,28%
Km terminados LD	77.70	Avance LI: 43,28%
Km en primera capa LI	48.40	
Km terminados LI	46.50	

REHABILITACIÓN DE LA VIA

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	50.21	54.37%
Km Terminados	0.00	

OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	
En Ejecución	13.00	32.27%
Terminados	0	



Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	
Km en Ejecución	17.56	63.57%
Km Terminados	17.56	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	
Km en Ejecución	19.15	56.67%
Km Terminados	3.27	

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)


EXPROPIACIONES

REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

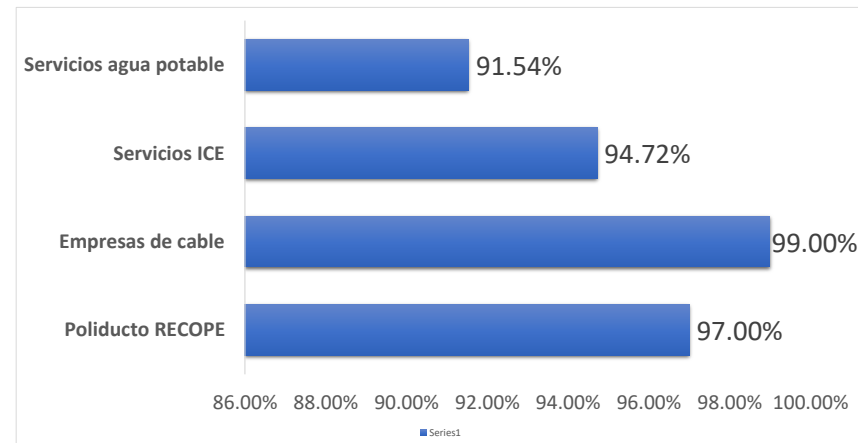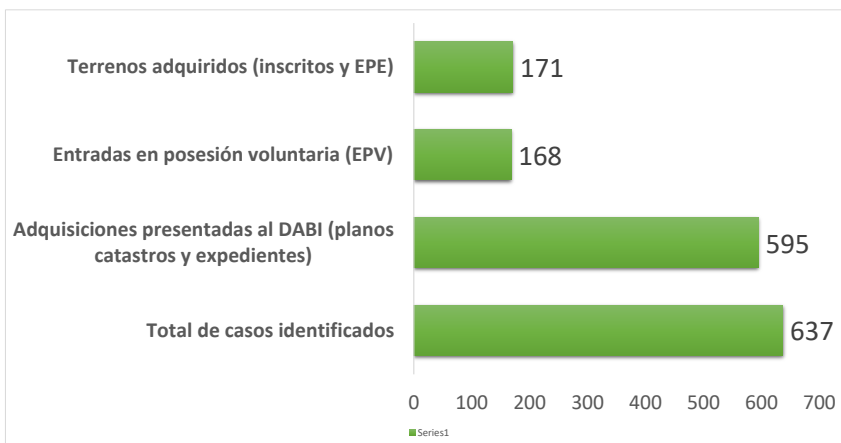

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

RESUMEN ESTADO ATENCIÓN CIUDADANA (COAPRO)
AGOSTO 2022

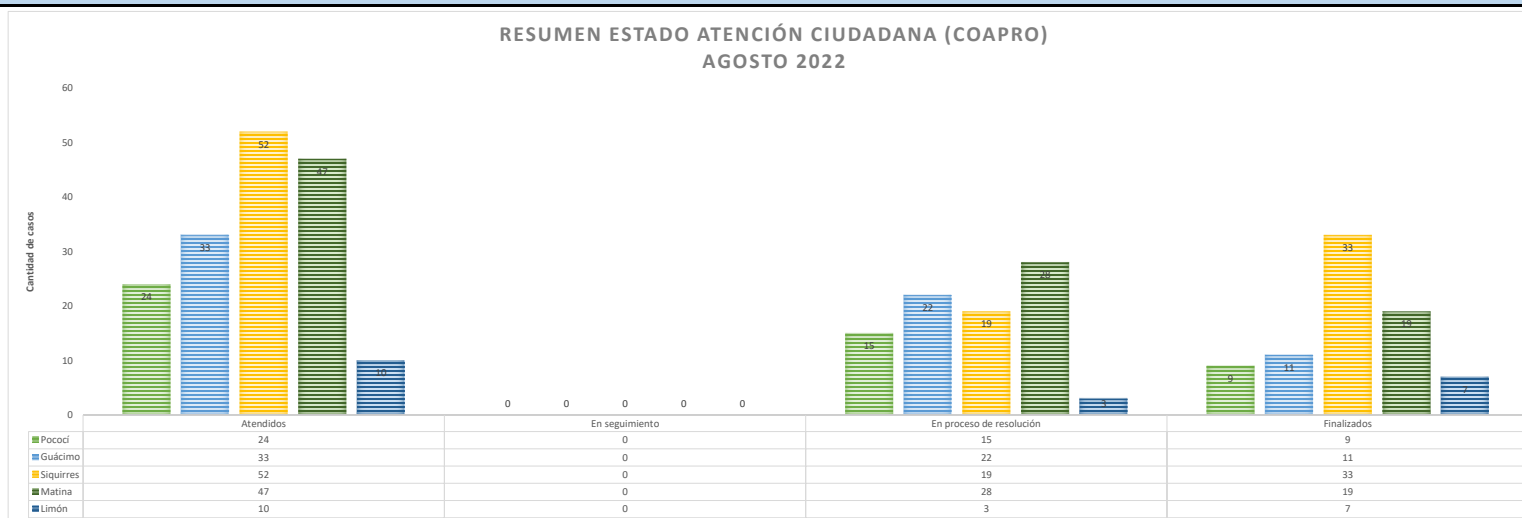

A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes.

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamento de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solución por parte de CHEC, por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.
