



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 48

MES: SEPTIEMBRE 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)


DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$22,143,950.57	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$43,075,011.95	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13)	08 de febrero de 2023
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato)	\$530,812,349.58	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)


Monto del Contrato US\$465,593,387,06

■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

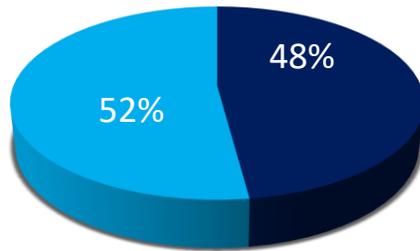


AVANCE FÍSICO


Avance Diseño

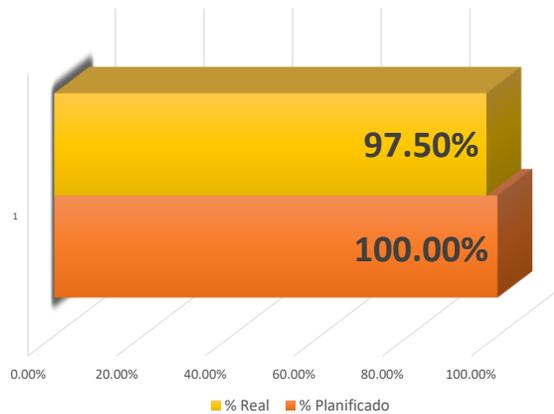

Avance Físico Construcción

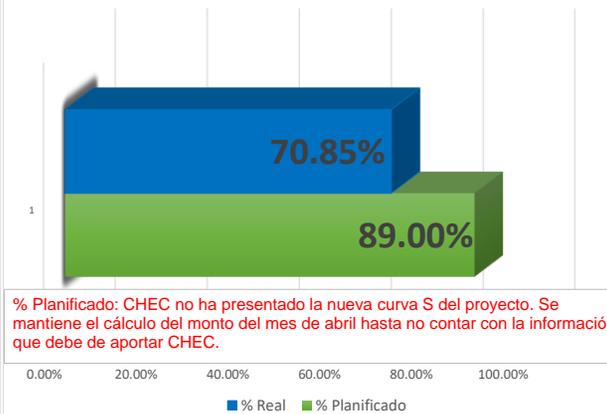

Avance Físico Diseño + Construcción

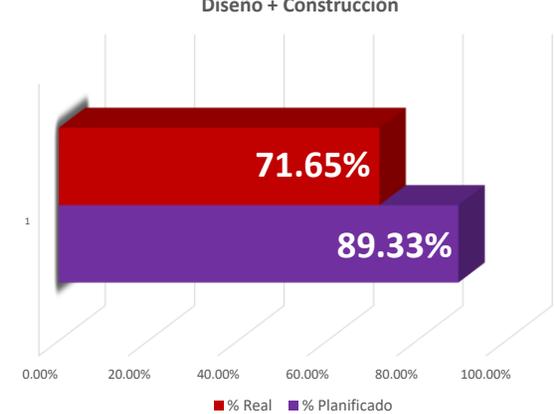



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 48

MES: SEPTIEMBRE 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	33	98.58%
Terminados	21	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	29	87.88%
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	
En Ejecución	11	17.06%
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	
En Ejecución	2	17.27%
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	
En Ejecución	18	75.00%
Terminados	0	

DRENAJES

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	
Alc faltante x Ejecutar LI	24	
Alc faltante x Ejecutar LD	30	Avance LD: 92,21%
Alc Terminadas LD	284	Avance LI: 90,26%
Alc Terminadas LI	278	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	107.40	
Km en Ejecución	61.50	57.28%
Km Terminados	61.50	

SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial	Cantidad	Avance
Km Totales	107.50	
Km en Ejecución	70.09	65.26%
Km Terminados	70.09	

CONSTRUCCION DE LA VIA

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	93.70	Avance LD: 87,19%
Km en ejecución LI	88.70	Avance LI: 82+49%
Km terminados LD	93.70	
Km terminados LI	88.70	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	92.30	Avance LD: 85,82%
Km en ejecución LI	66.00	Avance LI: 61,37%
Km terminados LD	92.30	
Km terminados LI	66.00	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en primera capa LD	83.80	Avance LD: 72,28%
Km terminados LD	77.70	Avance LI: 47,47%
Km en primera capa LI	53.10	
Km terminados LI	51.00	

REHABILITACIÓN DE LA VIA

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	53.13	54.37%
Km Terminados	0.00	




OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	
En Ejecución	13.00	32.27%
Terminados	0	

Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	
Km en Ejecución	20.07	75.10%
Km Terminados	19.32	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	
Km en Ejecución	19.78	59.85%
Km Terminados	3.72	

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

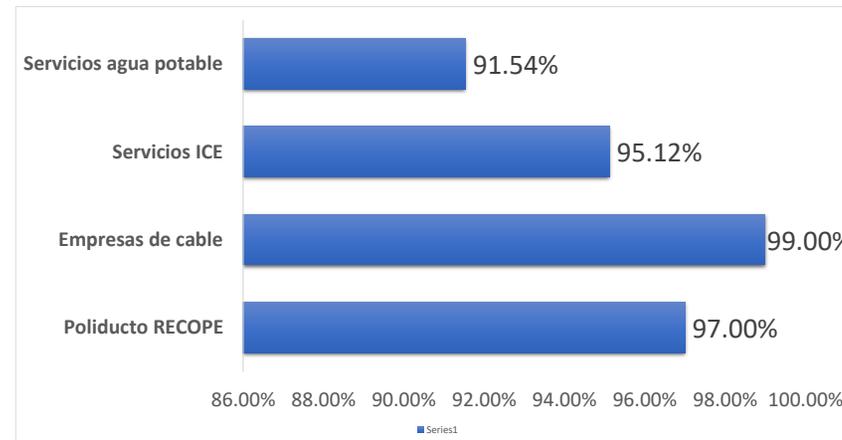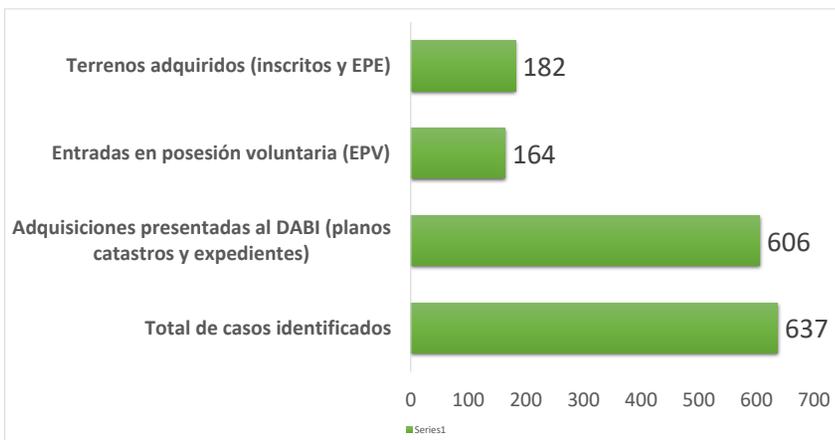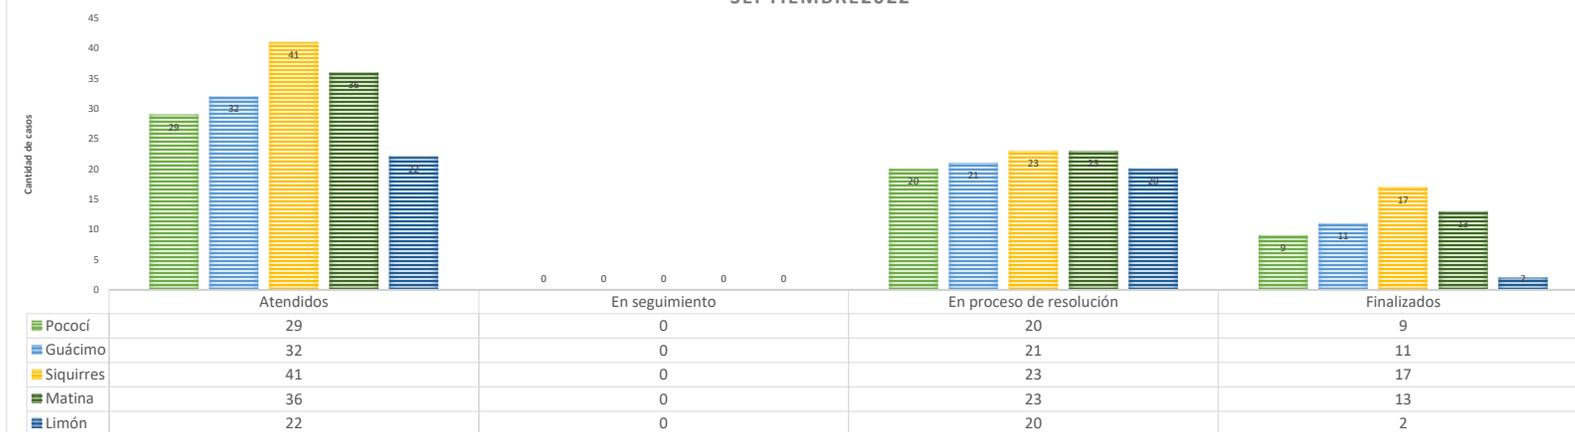EXPROPIACIONES
REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)
**RESUMEN ESTADO ATENCIÓN CIUDADANA (COAPRO)
SEPTIEMBRE 2022**


A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes.

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamento de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solución por parte de CHEC, por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.
