



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 50

MES: NOVIEMBRE 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)



DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$22,697,578.58	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$43,075,011.95	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13)	08 de febrero de 2023
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato)	\$531,365,977.59	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)


Monto del Contrato US\$465,593,387,06

■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

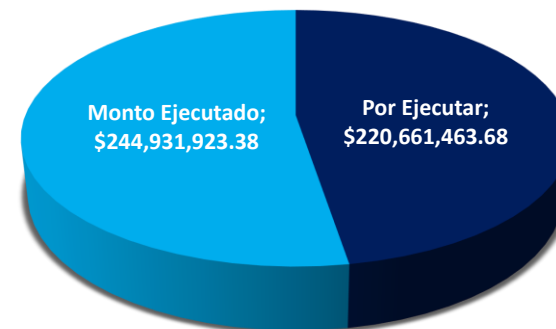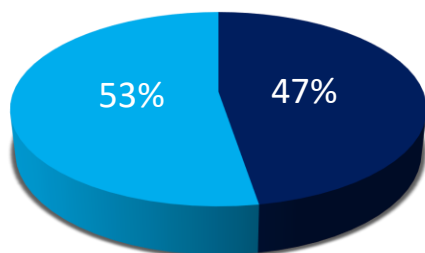


AVANCE FÍSICO


Avance Diseño

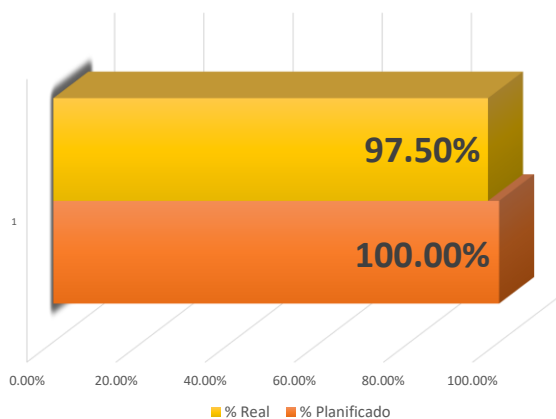

Avance Físico Construcción

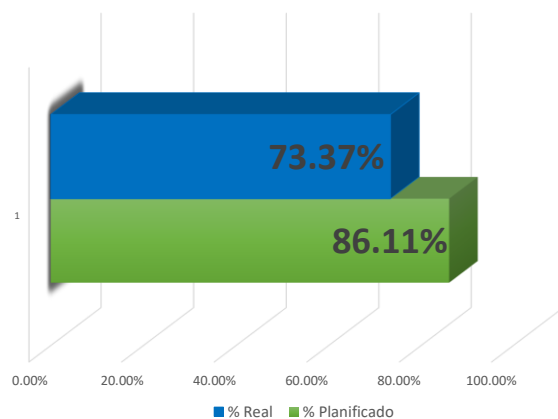

Avance Físico Diseño + Construcción

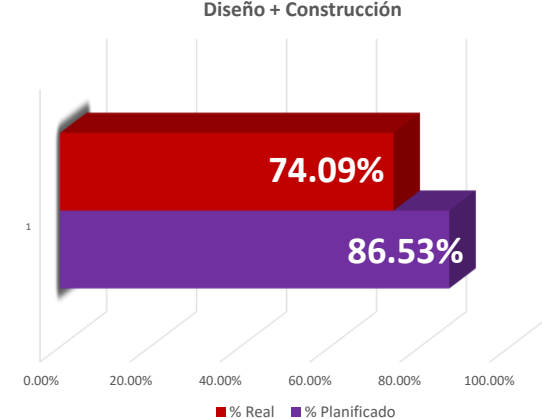



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 50

MES: NOVIEMBRE 2022



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	33	98.84%
Terminados	22	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	29	87.88%
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	
En Ejecución	12	21.57%
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	
En Ejecución	2	18.63%
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	
En Ejecución	20	83.33%
Terminados	0	

DRENAJES

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	
Alc faltante x Ejecutar LI	24	Avance LD: 92,21% Avance LI: 90,26%
Alc faltante x Ejecutar LD	30	
Alc Terminadas LD	284	
Alc Terminadas LI	278	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	107.40	
Km en Ejecución	63.20	58.82%
Km Terminados	63.20	

SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial	Cantidad	Avance
Km Totales	107.50	
Km en Ejecución	70.85	65.97%
Km Terminados	70.85	

CONSTRUCCION DE LA VIA

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	94.10	Avance LD: 87,55% Avance LI: 84,74%
Km en ejecución LI	91.10	
Km terminados LD	94.10	
Km terminados LI	91.10	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	92.60	Avance LD: 86,13% Avance LI: 62,87%
Km en ejecución LI	67.60	
Km terminados LD	92.60	
Km terminados LI	67.60	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en primera capa LD	84.20	Avance LD: 73,06% Avance LI: 50,28%
Km terminados LD	78.60	
Km en primera capa LI	56.90	
Km terminados LI	54.10	

REHABILITACIÓN DE LA VIA

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	56.91	52.94%
Km Terminados	0.00	




OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	
En Ejecución	13.00	40.00%
Terminados	0	

Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	
Km en Ejecución	20.71	76.76%
Km Terminados	19.72	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	
Km en Ejecución	21.83	63.68%
Km Terminados	3.72	

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

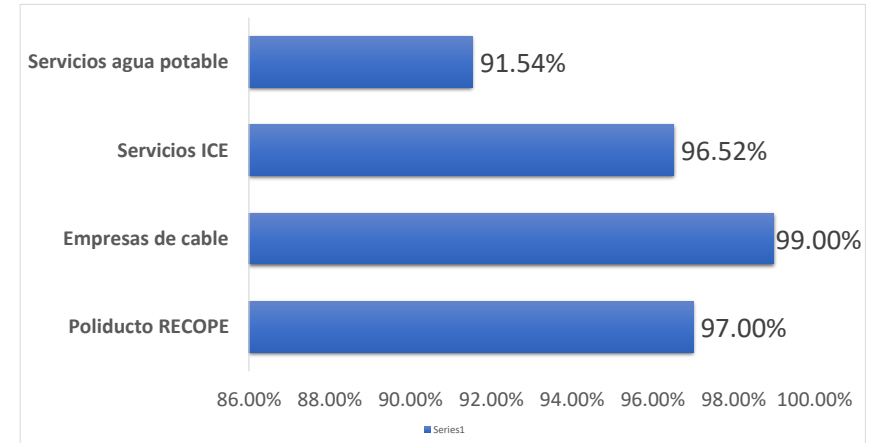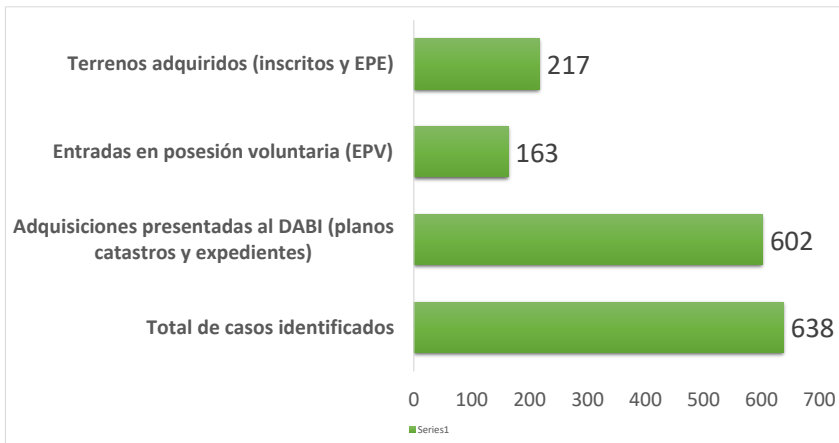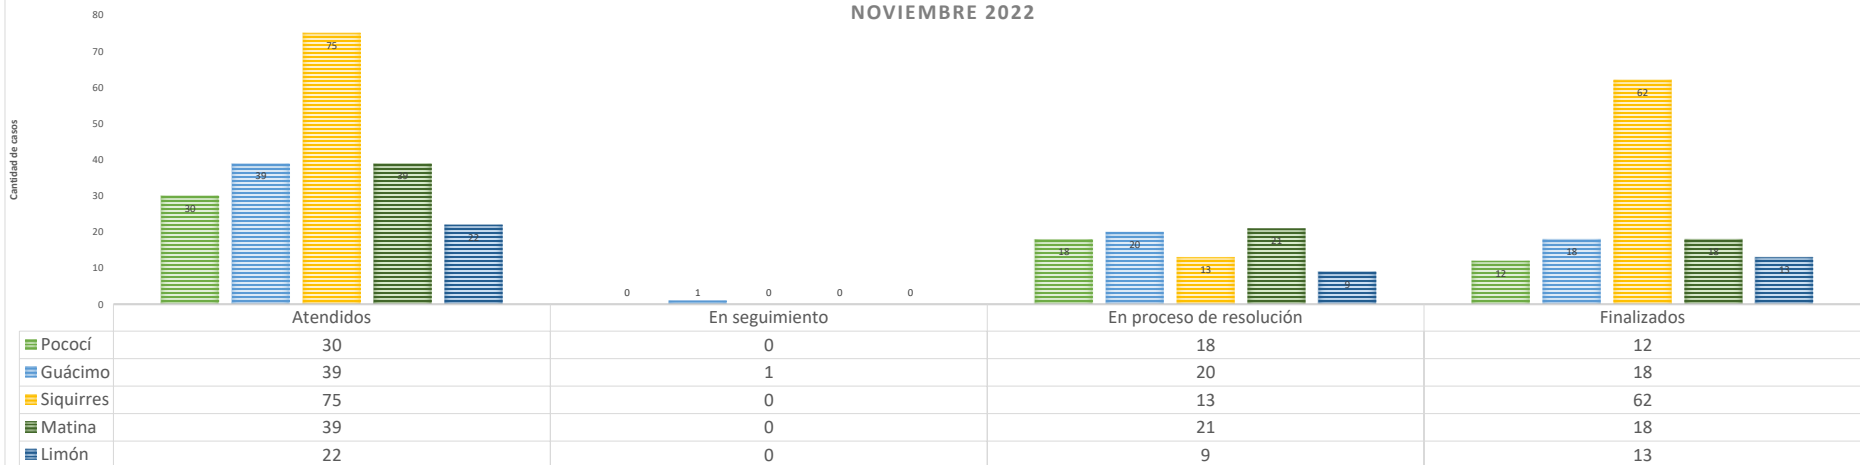EXPROPIACIONES
REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)
**RESUMEN ESTADO ATENCIÓN CIUDADANA (COAPRO)
NOVIEMBRE 2022**


A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes.

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamento de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solución por parte de CHEC, por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.
