



### INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 40

MES: DICIEMBRE 2021



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)


#### DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$20,546,853.71	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$35,031,939.08	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 11)	<b>22 de mayo de 2022</b>
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato)	\$521,172,179.85	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días

#### AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)


##### Monto del Contrato US\$465,593,387,06

■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

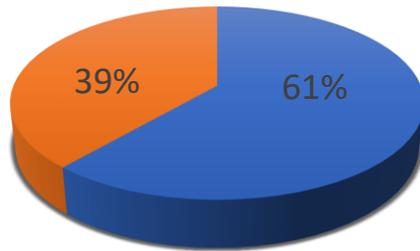


#### AVANCE FÍSICO

##### Avance de Diseño

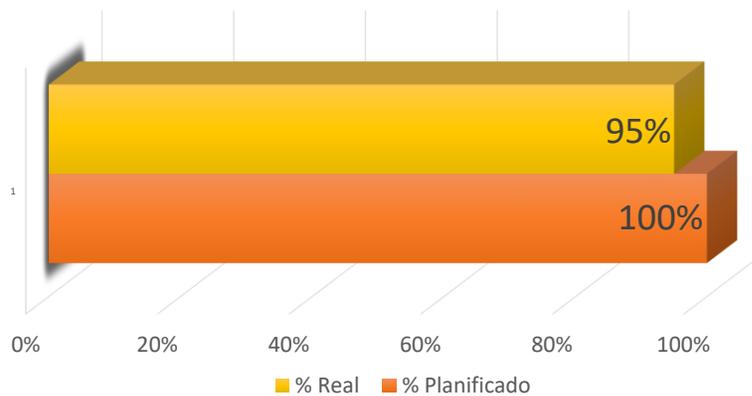

##### Avance Físico de Construcción

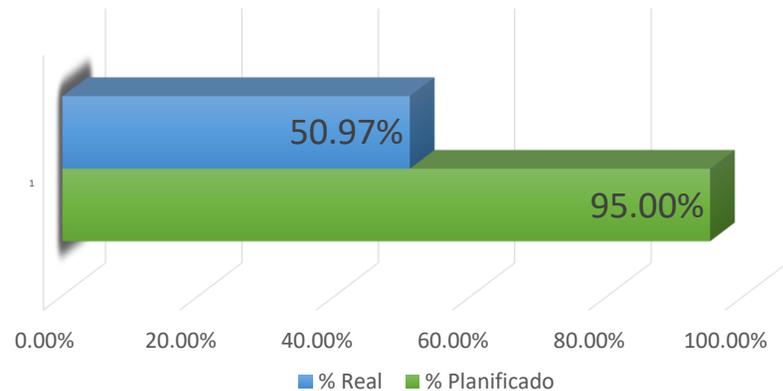

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

**DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA**
**ESTRUCTURAS MAYORES**

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	32	94.27%
Terminados	0	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	10	8.00%
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	
En Ejecución	5	6.67%
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	
En Ejecución	1	6.78%
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	
En Ejecución	10	41.67%
Terminados	0	

**DRENAJES**

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	
Alc faltante x Ejecutar LI	47	
Alc faltante x Ejecutar LD	65	Avance LD: 84,74%
Alc Terminadas LD	261	Avance LI: 78,90%
Alc Terminadas LI	243	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	51.40	
Km en Ejecución	32.38	32.38%
Km Terminados	34.80	

**SEGURIDAD VIAL**

Seguridad Vial	Cantidad	Avance
Km Totales	107.50	
Km en Ejecución	43.41	40.42%
Km Terminados	43.41	

**CONSTRUCCION DE LA VIA**

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	86.40	Avance LD: 80,35%
Km en ejecución LI	42.90	Avance LI: 39,95%
Km terminados LD	86.40	
Km terminados LI	43.00	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecución LD	79.60	Avance LD: 74,07%
Km en ejecución LI	13.80	Avance LI: 12,90%
Km terminados LD	79.60	
Km terminados LI	13.90	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en primera capa LD	63.60	Avance LD: 41,68%
Km terminados LD	44.80	Avance LI: 5,00%
Km en primera capa LI	15.90	
Km terminados LI	5.40	

**REHABILITACIÓN DE LA VIA**

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	16.82	15.65%
Km Terminados	0.00	



**OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES**

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	
En Ejecución	0.00	0.00%
Terminados	0	

Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	
Km en Ejecución	6.65	13.52%
Km Terminados	0	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	
Km en Ejecución	15.90	11.72%
Km Terminados	0	

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

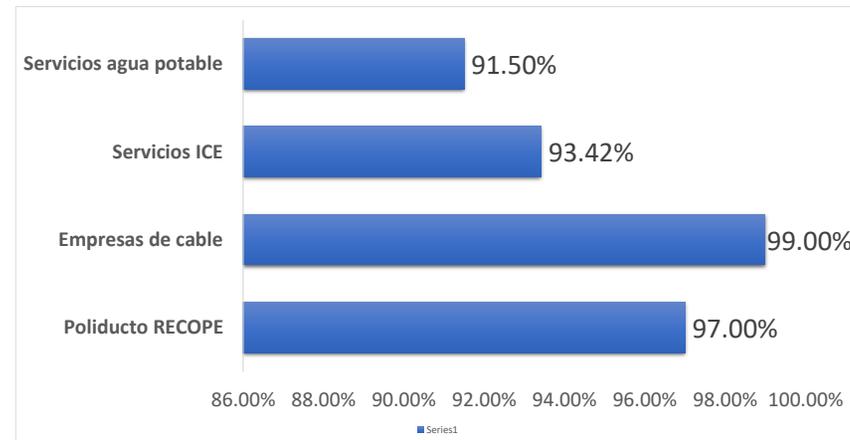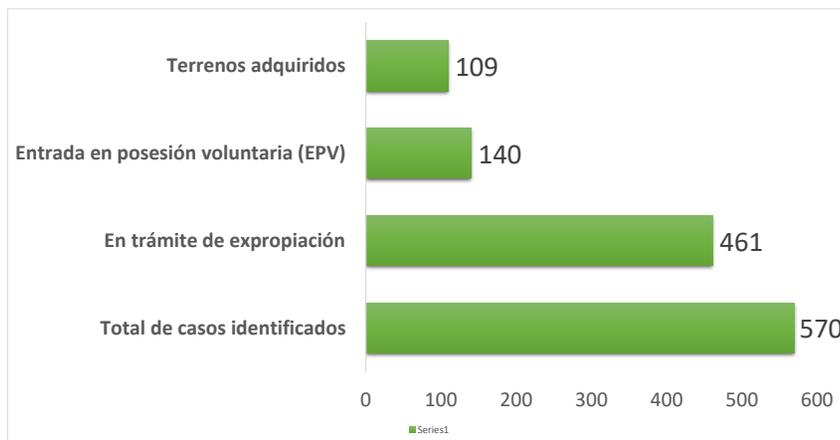**EXPROPIACIONES**
**REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**


**Nota:**  
La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras se realiza el trámite de adquisición definitivo.

**ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)**
**Resumen estado atención ciudadana (oficinas COAPRO)**

Cantón.	Total de casos atendidos.	Casos en etapa de seguimiento.	Casos en proceso de resolución.	Casos finalizados.	Control total de caso.
<b>Diciembre 2021</b>					
Pococí	14	0	4	10	21
Guácimo	29	0	12	17	47
Siquirres	57	0	21	36	111
Matina	55	1	27	27	103
Limón	4	0	2	2	4
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>92</b>	<b>286</b>

**A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos.**

**Total casos atendidos:** como su palabra lo indica es el total de casos atendidos en el mes.

**Casos en seguimiento:** son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamento de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

**Casos en proceso:** son aquellos casos en espera de respuesta o solución por parte de CHEC, por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y alguna institución.

**Casos finalizados:** como su palabra lo dice los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

**Control de casos:** corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.
