



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 30

MES: FEBRERO 2021



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)


DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción):	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras O.S. eventos compensables	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos:	\$20,000,000.00	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato:	\$33,075,439.75	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 11):	22 de mayo de 2022
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato):	\$518,668,826.81	Plazo Original de Contrato D + C:	1291 días

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)


Monto del Contrato US\$465,593,387,06

■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

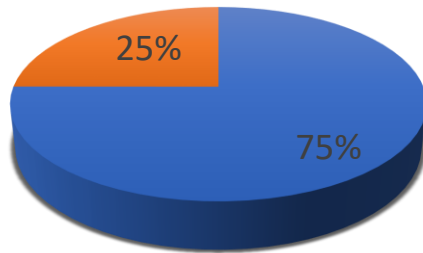


AVANCE FISICO

Avance de Diseño

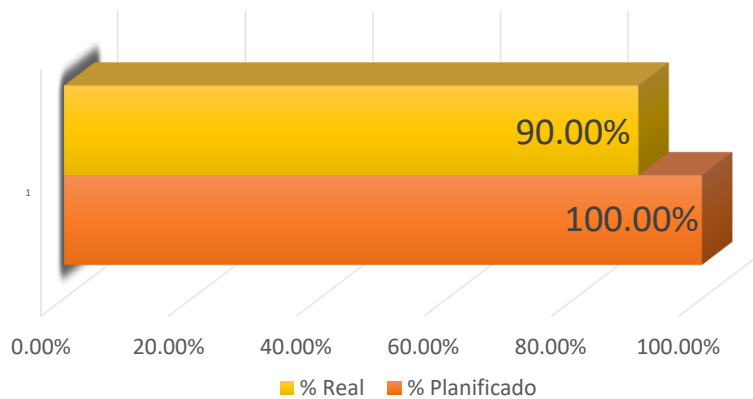

Avance Físico de Construcción

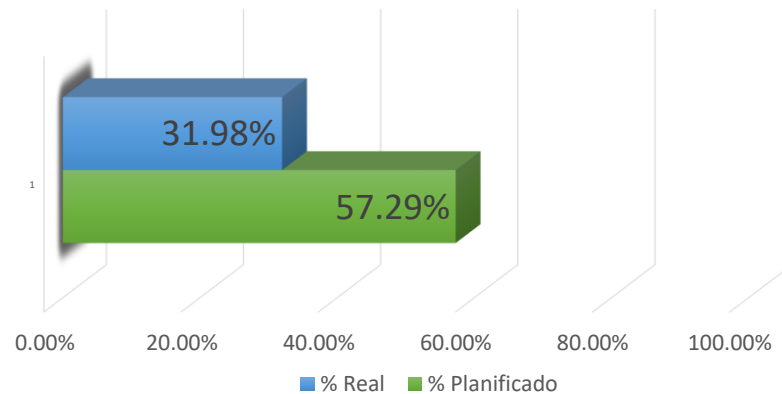



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 30

MES: FEBRERO 2021



OBRA Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo
SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
GESTOR DEL PROYECTO Consorcio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	32	74.76%
Terminados	0	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	1	1.00%
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	
En Ejecución	2	2.09%
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	
En Ejecución	1	3.00%
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	
En Ejecución	5	5.50%
Terminados	0	

DRENAJES

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	304	
En Ejecución	220	72.37%
Terminados	12	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	51.40	
Km en Ejecución	33.87	65.91%
Km Terminados	33.87	

SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial	Cantidad	Avance
Km Totales	107.50	
Km en Ejecución	17.99	16.75%
Km Terminados	17.99	

CONSTRUCCION DE LA VIA

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	57.14	53.15%
Km Terminados	57.14	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	51.94	48.32%
Km Terminados	51.94	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	15.95	14.83%
Km Terminados	15.95	

REHABILITACION DE LA VIA

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	7.60	0.00%
Km Terminados	0.00	

OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	
En Ejecución	0.00	0.00%
Terminados	0	

Ciclo vías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	
Km en Ejecución	22.05	1.56%
Km Terminados	0	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	
Km en Ejecución	5.24	4.00%
Km Terminados	0	



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

EXPROPIACIONES

REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

