



### INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 37

MES: SEPTIEMBRE 2021



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)



#### DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción)	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras (O.S. No. 2)	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos	\$20,000,000.00	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato	\$33,075,439.75	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 11)	<b>22 de mayo de 2022</b>
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato)	\$518,668,826.81	Plazo Original de Contrato D + C	1291 días

#### AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)


##### Monto del Contrato US\$465,593,387,06

■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

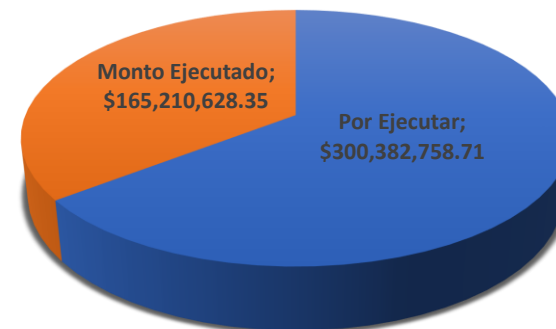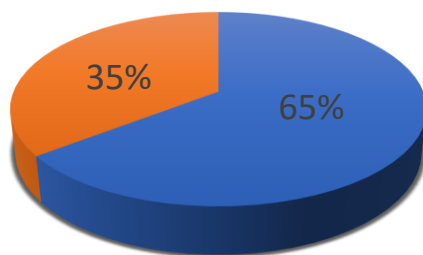


#### AVANCE FÍSICO

##### Avance de Diseño

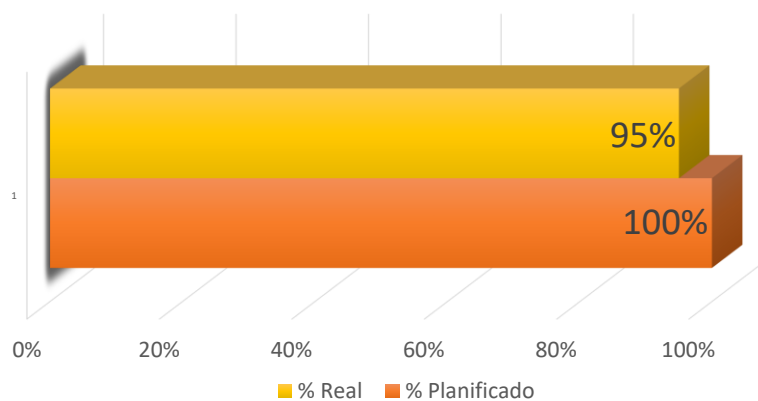

##### Avance Físico de Construcción

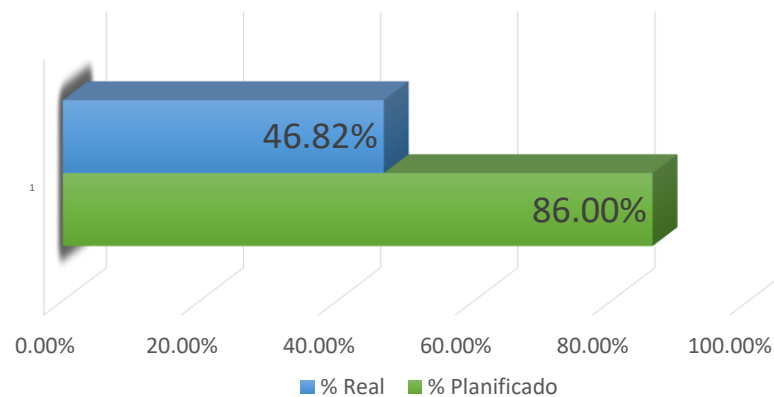



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 37

MES: SEPTIEMBRE 2021



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

**DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA**

**ESTRUCTURAS MAYORES**

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	32	92.12%
Terminados	0	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	10	8.00%
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	
En Ejecución	5	5.13%
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	
En Ejecución	1	6.78%
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	
En Ejecución	10	41.67%
Terminados	0	

**DRENAJES**

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	
Alc faltante x Ejecutar LI	56	
Alc faltante x Ejecutar LD	80	Avance LD: 81,82%
Alc Terminadas LD	252	Avance LI: 74,03%
Alc Terminadas LI	228	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	51.40	
Km en Ejecución	25.79	27.70%
Km Terminados	25.79	

**SEGURIDAD VIAL**

Seguridad Vial	Cantidad	Avance
Km Totales	107.50	
Km en Ejecución	41.45	38.59%
Km Terminados	41.45	

**CONSTRUCCION DE LA VIA**

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecucion LD	26.10	Avance LD: 77,75%
Km en ejecucion LI	25.90	Avance LI: 34,79%
Km terminados LD	57.50	
Km terminados LI	11.50	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecucion LD	32.50	Avance LD: 66,89%
Km en ejecucion LI	4.73	Avance LI: 8,12%
Km terminados LD	40.50	
Km terminados LI	4.00	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en primera capa LD	44.10	Avance LD: 20,32%
Km terminados LD	21.80	Avance LI: 5,00%
Km en primera capa LI	15.90	
Km terminados LI	5.40	

**REHABILITACIÓN DE LA VIA**

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en Ejecución	16.23	15.10%
Km Terminados	0.00	



**OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES**

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	
En Ejecución	0.00	0.00%
Terminados	0	

Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	
Km en Ejecución	2.54	8.33%
Km Terminados	0	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	
Km en Ejecución	9.24	10.58%
Km Terminados	0	

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

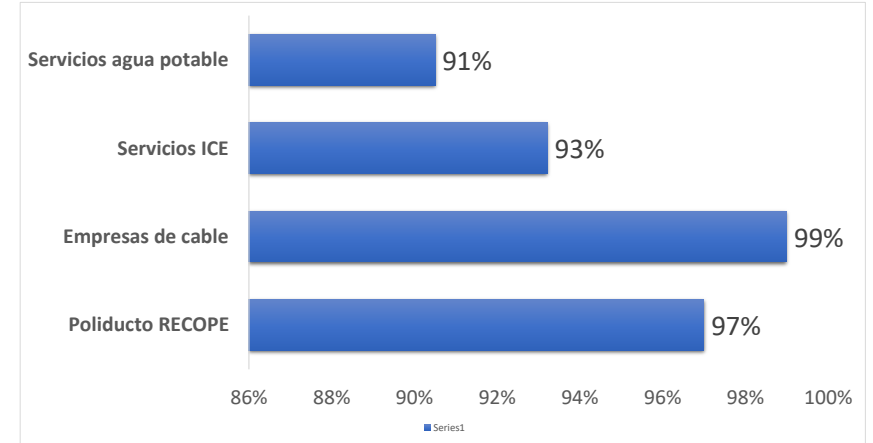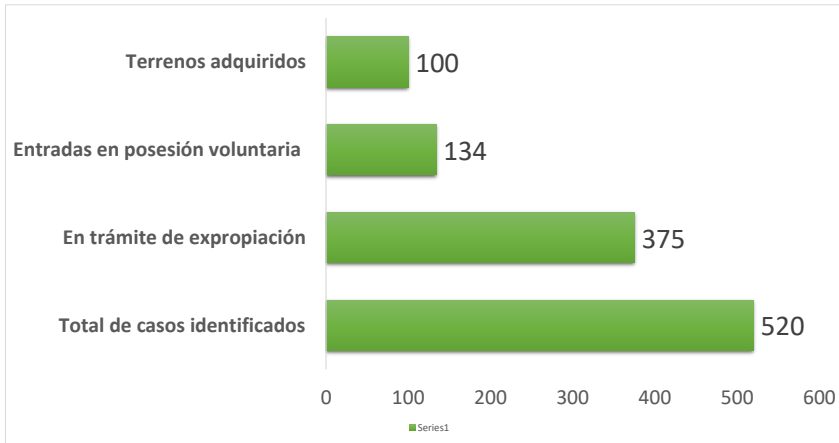**EXPROPIACIONES**
**REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)**
**Resumen estado atención ciudadana (oficinas COAPRO)**

Cantón.	Total de casos atendidos.	Casos en etapa de seguimiento.	Casos en proceso de resolución.	Casos finalizados.	Control total de caso.
<b>Septiembre 2021</b>					
Pococí	22	0	8	14	43
Guácimo	18	0	13	5	38
Siquirres	31	0	13	18	43
Matina	43	0	21	22	83
Limón	24	0	17	7	30
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>237</b>

**A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos.**

**Total casos atendidos:** como su palabra lo indica es el total de casos atendidos en el mes.

**Casos en seguimiento:** son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamento de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

**Casos en proceso:** son aquellos casos en espera de respuesta o solución por parte de CHEC, por topografía, por la Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y alguna institución.

**Casos finalizados:** como su palabra lo dice los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

**Control de casos:** corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y visitas de campo.
