



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 34

MES: JUNIO 2021



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)


DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.	CONAVI-CHEC-001	Fecha Orden de Inicio diseño	14 de diciembre 2016
Total Contrato (Diseño + Construcción):	\$465,593,387.06	Fecha fin diseño de obras O.S. eventos compensables	30 de septiembre 2017
Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos:	\$20,000,000.00	Fecha Orden de Inicio construcción	20 de noviembre 2017
Inversión para la Administración del Contrato:	\$33,075,439.75	Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 11):	22 de mayo de 2022
Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos + Administración del Contrato):	\$518,668,826.81	Plazo Original de Contrato D + C:	1291 días

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)


Monto del Contrato US\$465,593,387,06

■ Por Ejecutar ■ Monto Ejecutado

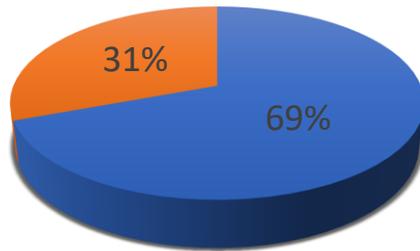


AVANCE FÍSICO

Avance de Diseño

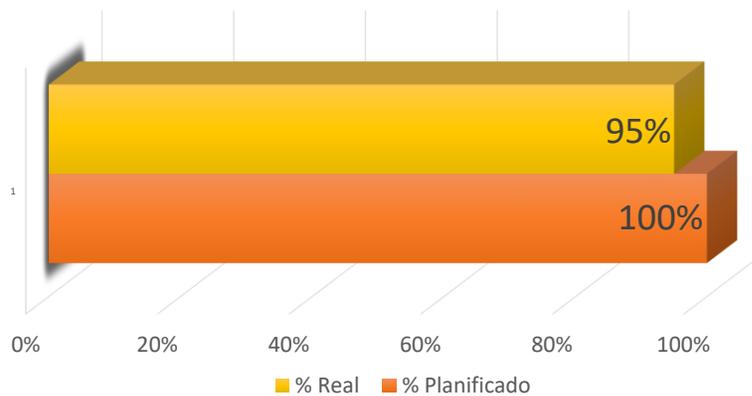

Avance Físico de Construcción

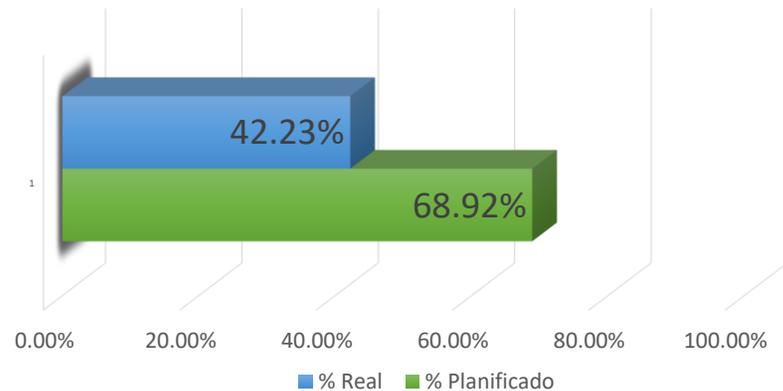



INFORME EJECUTIVO DE OBRAS No. 34

MES: JUNIO 2021



OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

DETALLE DE AVANCE FÍSICO REAL DE OBRA

ESTRUCTURAS MAYORES

Puentes Nuevos	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	32	84.74%
Terminados	0	

Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir	Cantidad	Avance
Puentes Totales	33	
En Ejecución	10	8.00%
Terminados	0	

Pasos Superiores Vehiculares	Cantidad	Avance
Puentes Totales	13	
En Ejecución	5	4.85%
Terminados	0	

Intercambios	Cantidad	Avance
Puentes Totales	5	
En Ejecución	1	3.87%
Terminados	0	

Puentes Peatonales	Cantidad	Avance
Puentes Totales	24	
En Ejecución	10	7.21%
Terminados	0	

DRENAJES

Alcantarillas	Cantidad	Avance
Alcantarillas Totales	308	
Alc faltante x Ejecutar LI	62	Avance LD: 79,87% Avance LI: 71,43%
Alc faltante x Ejecutar LD	88	
Alc Terminadas LD	246	
Alc Terminadas LI	220	

Cunetas	Cantidad	Avance
Km Totales	51.40	
Km en Ejecución	23.20	21.64%
Km Terminados	23.20	

SEGURIDAD VIAL

Seguridad Vial	Cantidad	Avance
Km Totales	107.50	33.58%
Km en Ejecución	36.07	
Km Terminados	36.07	

CONSTRUCCION DE LA VIA

Subbase	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecucion LD	24.77	Avance LD: 74,62% Avance LI: 26,72%
Km en ejecucion LI	17.26	
Km terminados LD	55.47	
Km terminados LI	11.46	

Base Estabilizada	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en ejecucion LD	30.67	Avance LD: 65,23% Avance LI: 7,79%
Km en ejecucion LI	4.38	
Km terminados LD	39.46	
Km terminados LI	4.00	

Asfalto	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	
Km en primera capa LD	36.89	Avance LD: 15,85% Avance LI: 5,00%
Km terminados LD	17.04	
Km en primera capa LI	15.91	
Km terminados LI	5.38	

REHABILITACIÓN DE LA VÍA

Rehabilitación de la Vía	Cantidad	Avance
Kms Totales	107.50	7.80%
Km en Ejecución	8.39	
Km Terminados	0.00	



OBRAS SECUNDARIAS FUNDAMENTALES

Accesos	Cantidad	Avance
Accesos Totales	18.00	0.00%
En Ejecución	0.00	
Terminados	0	

Ciclovías	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.16	5.73%
Km en Ejecución	2.52	
Km Terminados	0	

Marginales	Cantidad	Avance
Kms Totales	26.18	7.58%
Km en Ejecución	8.36	
Km Terminados	0	

OBRA	Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo	CONTRATISTA	China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
SECCION	Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón	GESTOR DEL PROYECTO	Consortio Supervisor RN32 (CACISA/Camacho & Mora)

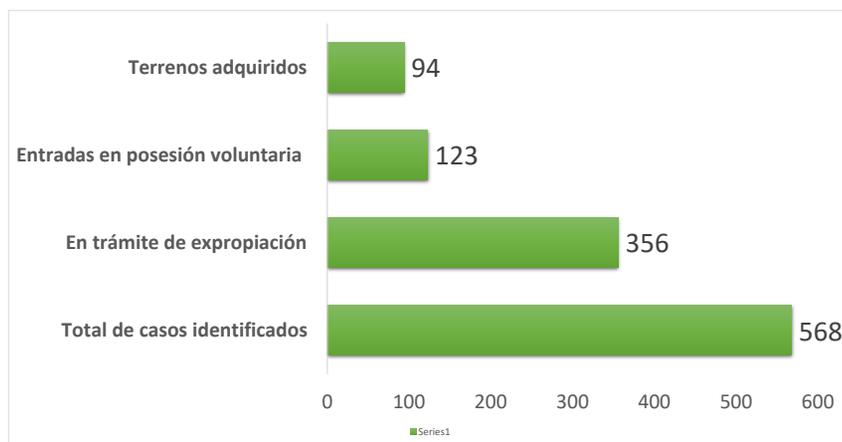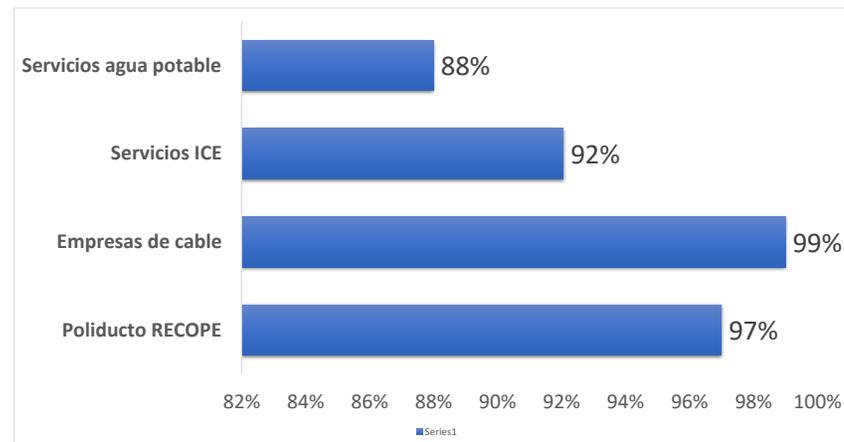EXPROPIACIONES

REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)
Resumen estado atención ciudadana (oficinas COAPRO) JUNIO 2021

Cantón.	Total de casos atendidos.	Casos en etapa de seguimiento.	Casos en proceso de resolución.	Casos finalizados.	Control total de caso.
Junio 2021					
Pococí	22	0	12	10	38
Guácimo	35	0	20	15	61
Siquirres	54	0	13	41	83
Matina	55	0	15	40	86
Limón	5	0	1	4	7
Total	171	0	61	110	275
